





Réaménagement de la place Carnot et de la place Louis Lacombe FIGEAC

REUNION PUBLIQUE DU 07 SEPTEMBRE 2023

UN SOL LIBRE, PARCOURABLE EN TOUS SENS

- Araser le socle pour mettre à niveau l'ensemble de la place et libérer les parcours piétons
- Réorganiser le stationnement pour réouvrir les perspectives vers Champollion

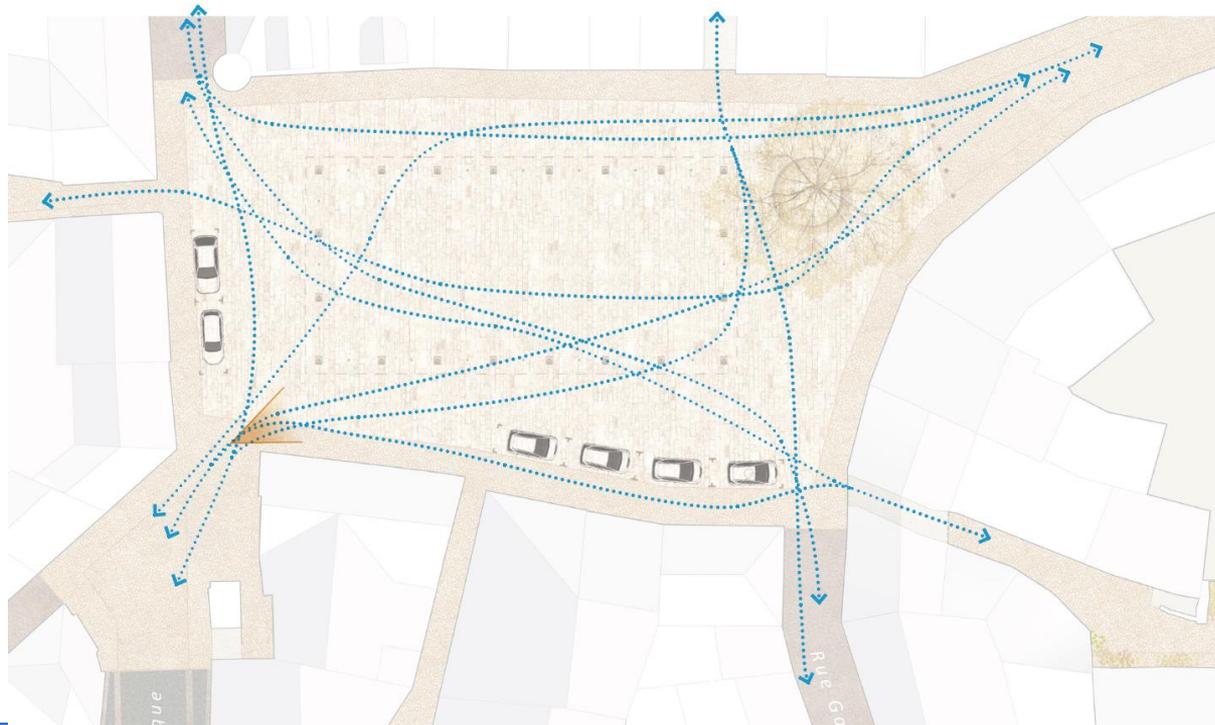

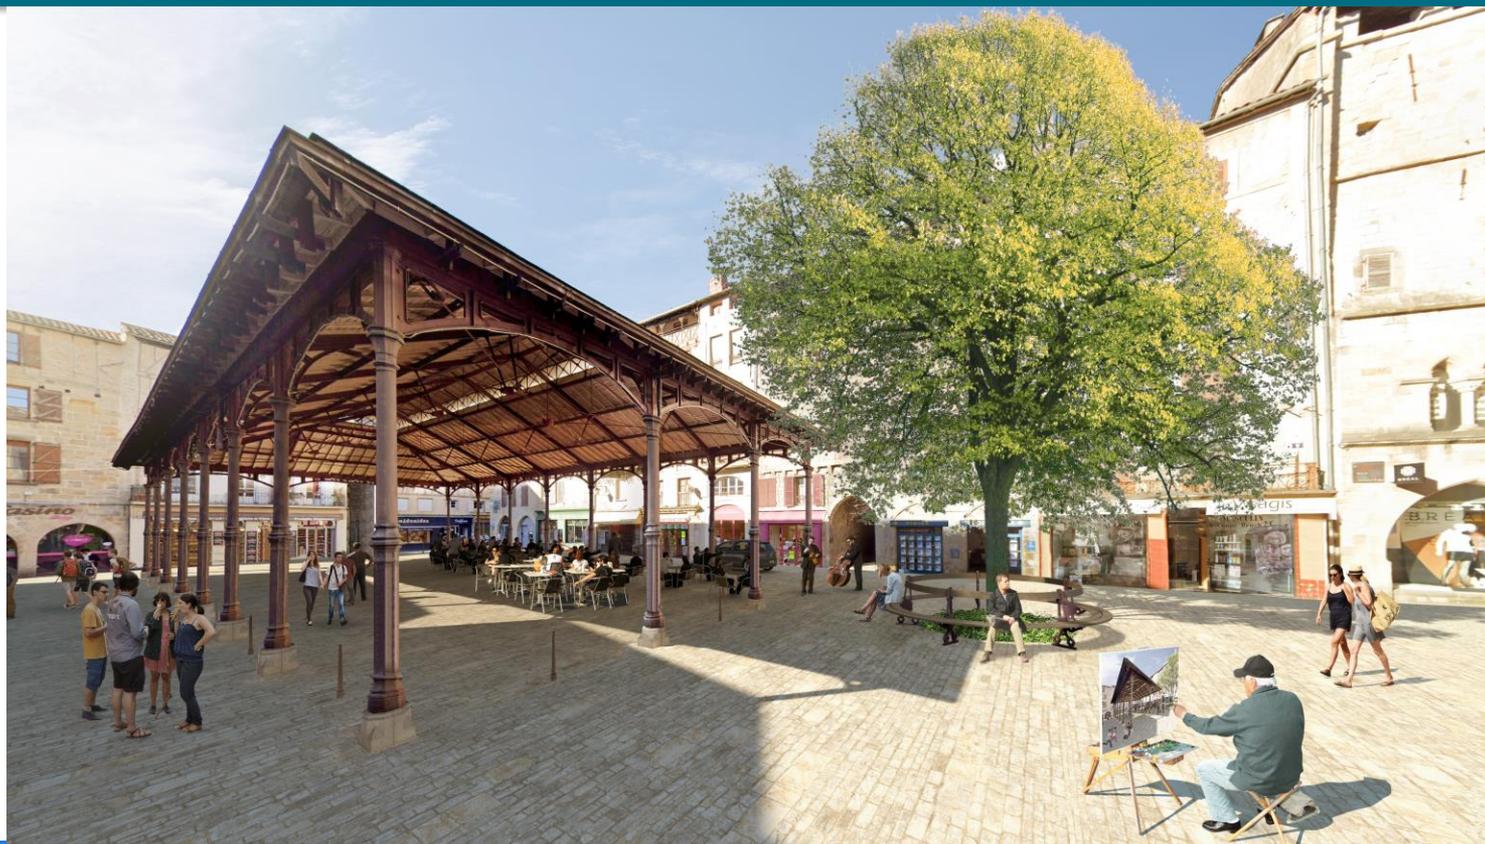

PERSPECTIVE PROJET



LOT 1 – VRD - TERRASSEMENTS - RESEAUX

Directeur de Travaux : Laurent LHERITIER

Conducteur de Travaux : Alain BASTARD

Chef de Chantier : Pascal TEIL

Contact téléphonique : 06 89 72 20 64

Conducteur de Travaux : Jérôme GALLEYRAND 05/65/35/53/30

Chef de Chantier : N. HERMIER 06/60/44/42/52



LOT 2 – PAVAGE - MOBILIER URBAIN - ESPACES VERTS

Directeur de Travaux : Patrice BALDY 06/21/53/68/04

Assistante de Travaux : Solène BOURRIER 06/18/81/65/33

Chef de Chantier : Frédéric COMBELLE 06/75/20/56/85



Conducteur Travaux : Pierre GUILLEMIN 06/43/36/53/21

Chef de Chantier :



LOT 3 – ECLAIRAGE – ELECTRICITE


Directeur de Travaux : Cedric GICQUEL	06/42/17/32/76
Chargé d'affaires : Hugo LAPORTE	06/23/31/62/75
Conducteur de Travaux : Hugo VIDAL	06/30/75/22/91
Chef de Chantier : Romain BONNET	06/70/57/52/00




Les entreprises seront présentes sur le chantier du lundi au vendredi de :

7h30 à 18h00



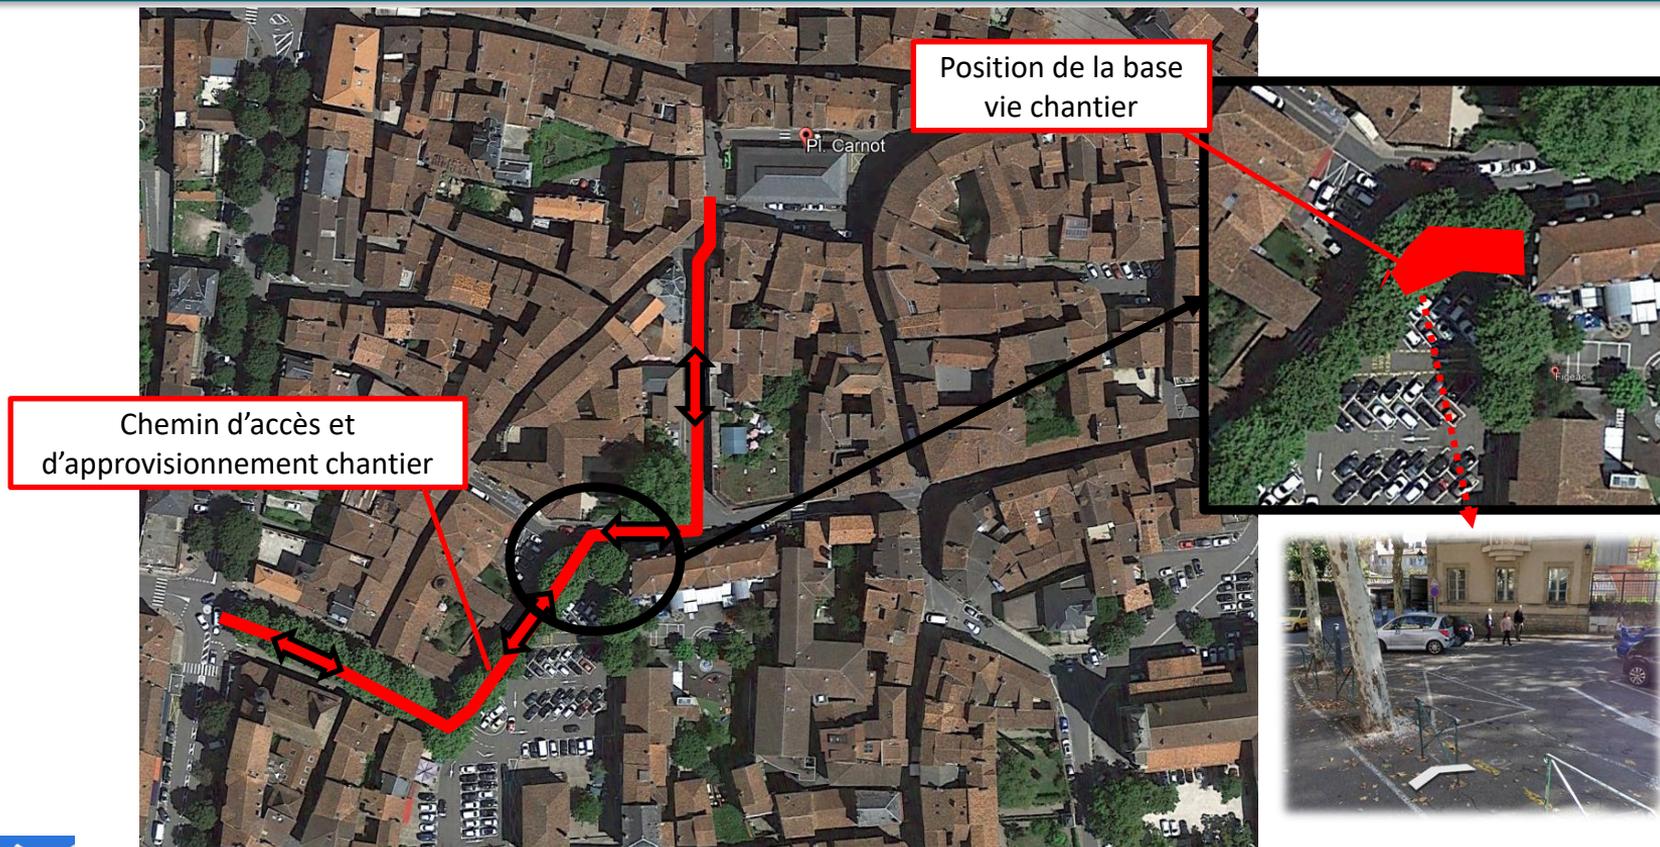

Plan de situation des phases

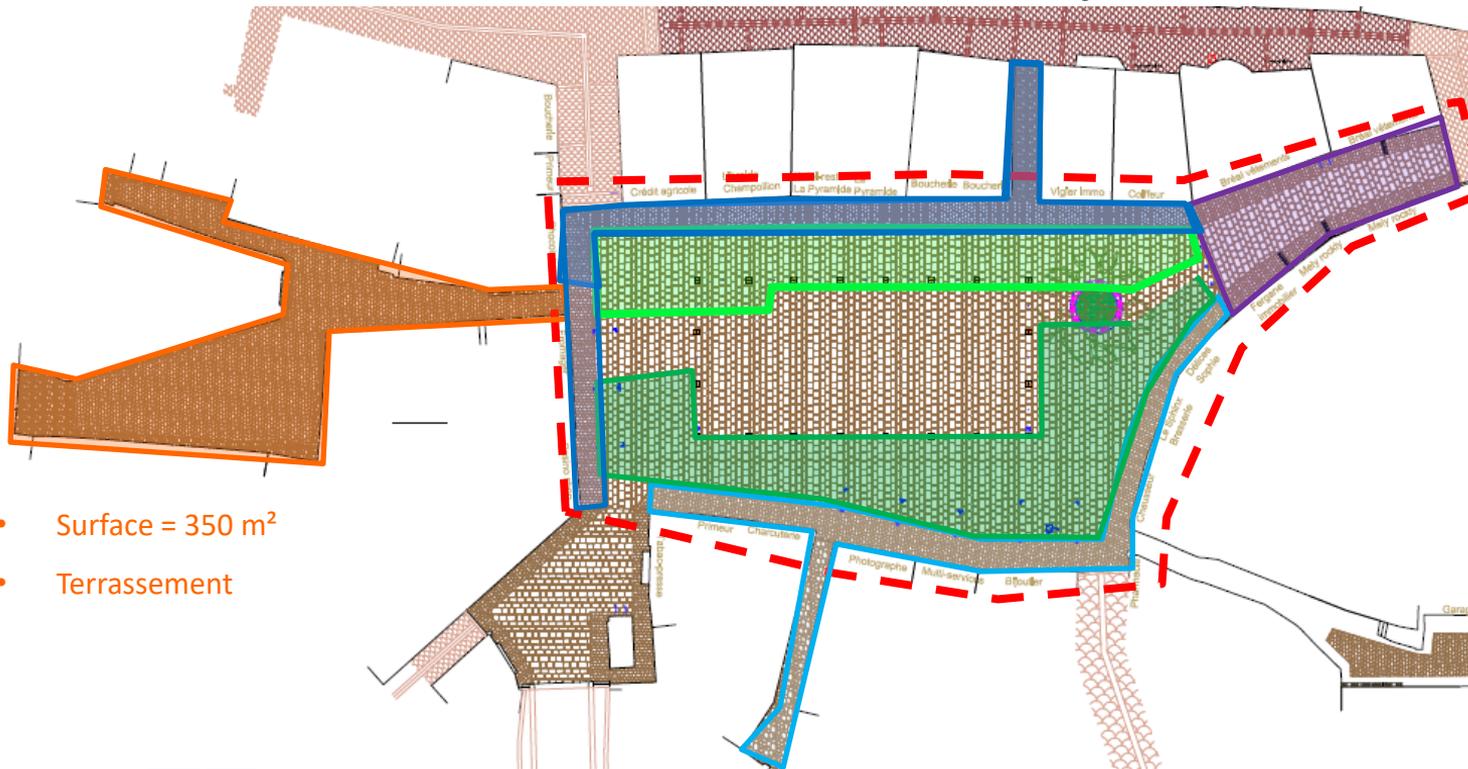


- Surface = 350 m²
- Terrassement

- Phase 1a
- Phase 1b
- Phase 1c
- Phase 1d
- Phase 1e
- Place Lacombe



PHASE 1a + Place Lacombe : 18/09 au 25/09/23

- Surface = 200 m²
- Terrassement – Réseaux
- Plateforme + GC

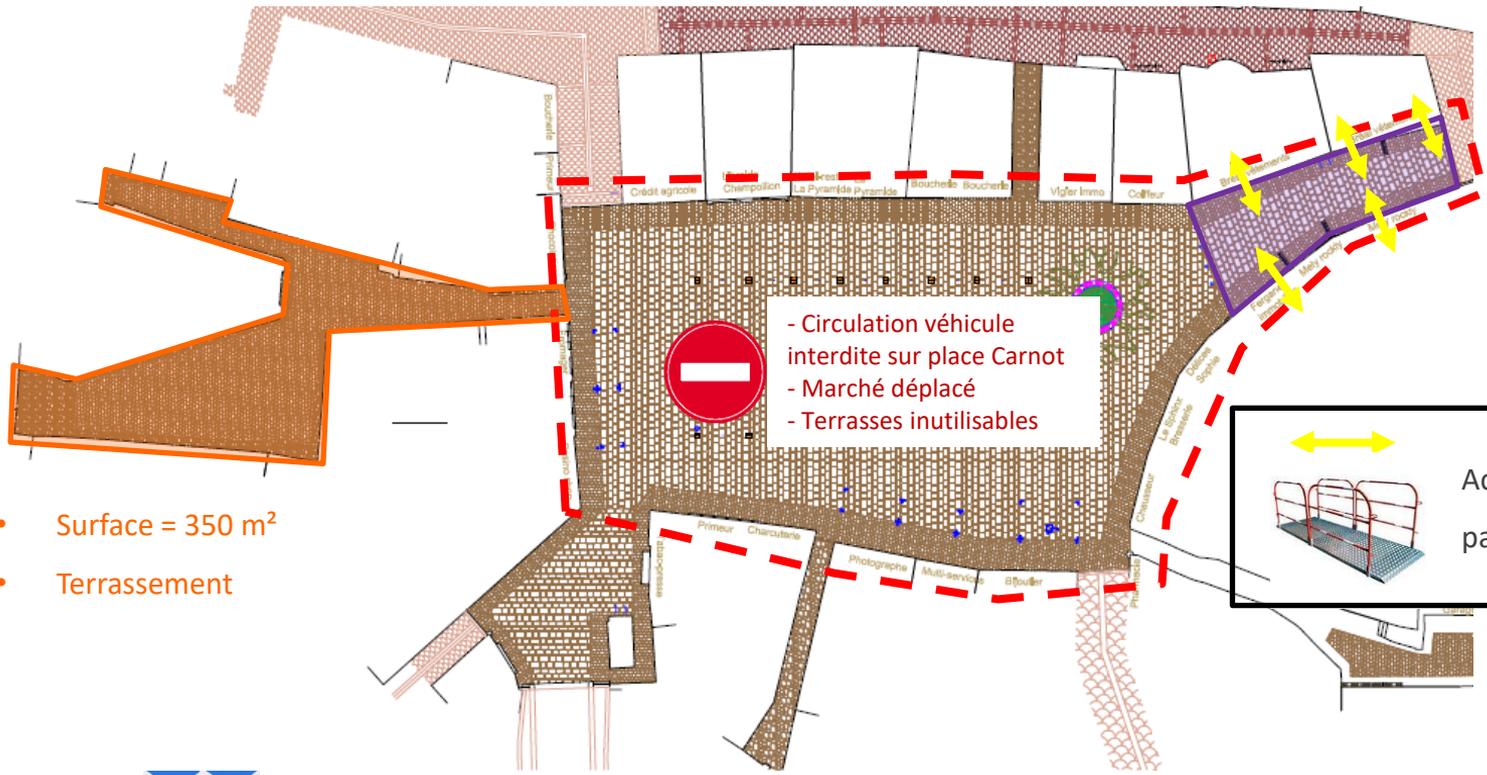



- Circulation véhicule interdite sur place Carnot
- Marché déplacé
- Terrasses inutilisables

Accès riverain et commerce par passerelle TP

- Surface = 350 m²
- Terrassement




PHASE 1a + Place Lacombe + PHASE 1d : 25/09 au 09/10/23

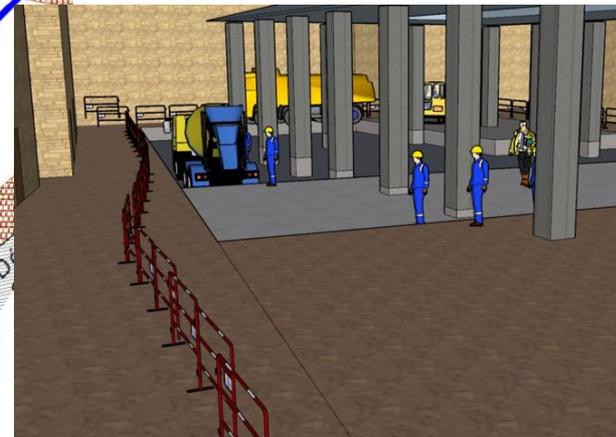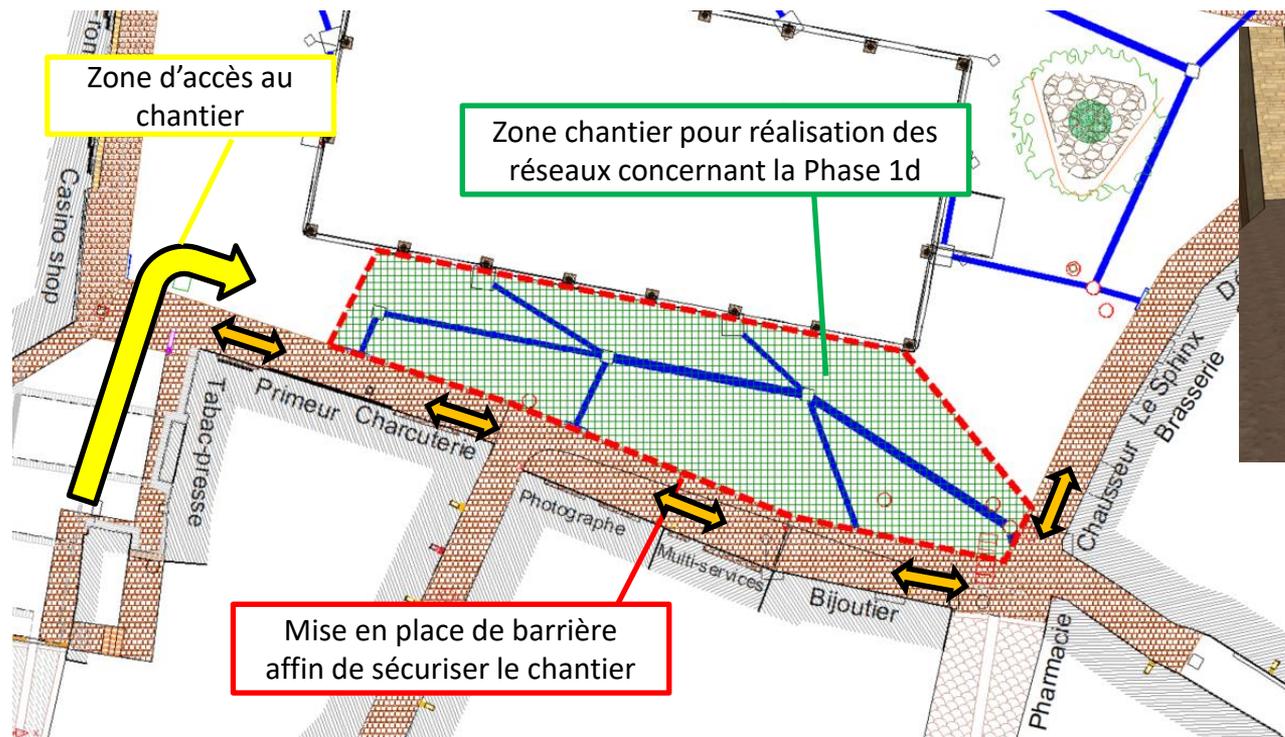


- Béton + séchage
- Réseaux
- Grave ciment + béton
- Terrassement
- Démolition

PHASE 1a + PHASE 1e + Place Lacombe + PHASE 1d : 10/10 au 19/10/23

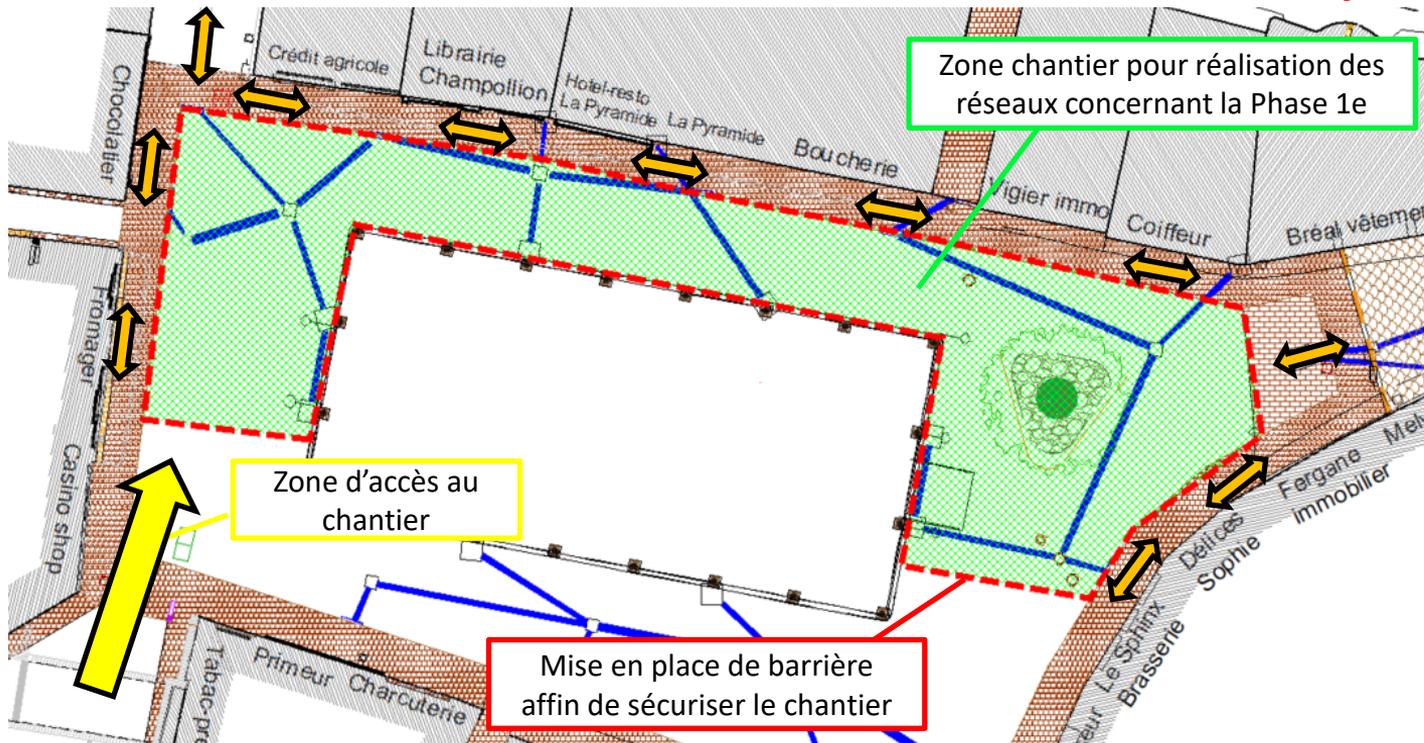


- Pose pavés
- Terrassement
- Pose des réseaux
- Séchage béton
- Pose des réseaux
- Grave ciment

PHASE 1a + Place Lacombe + PHASE 1b + PHASE 1e : 19/10 au 31/10/23

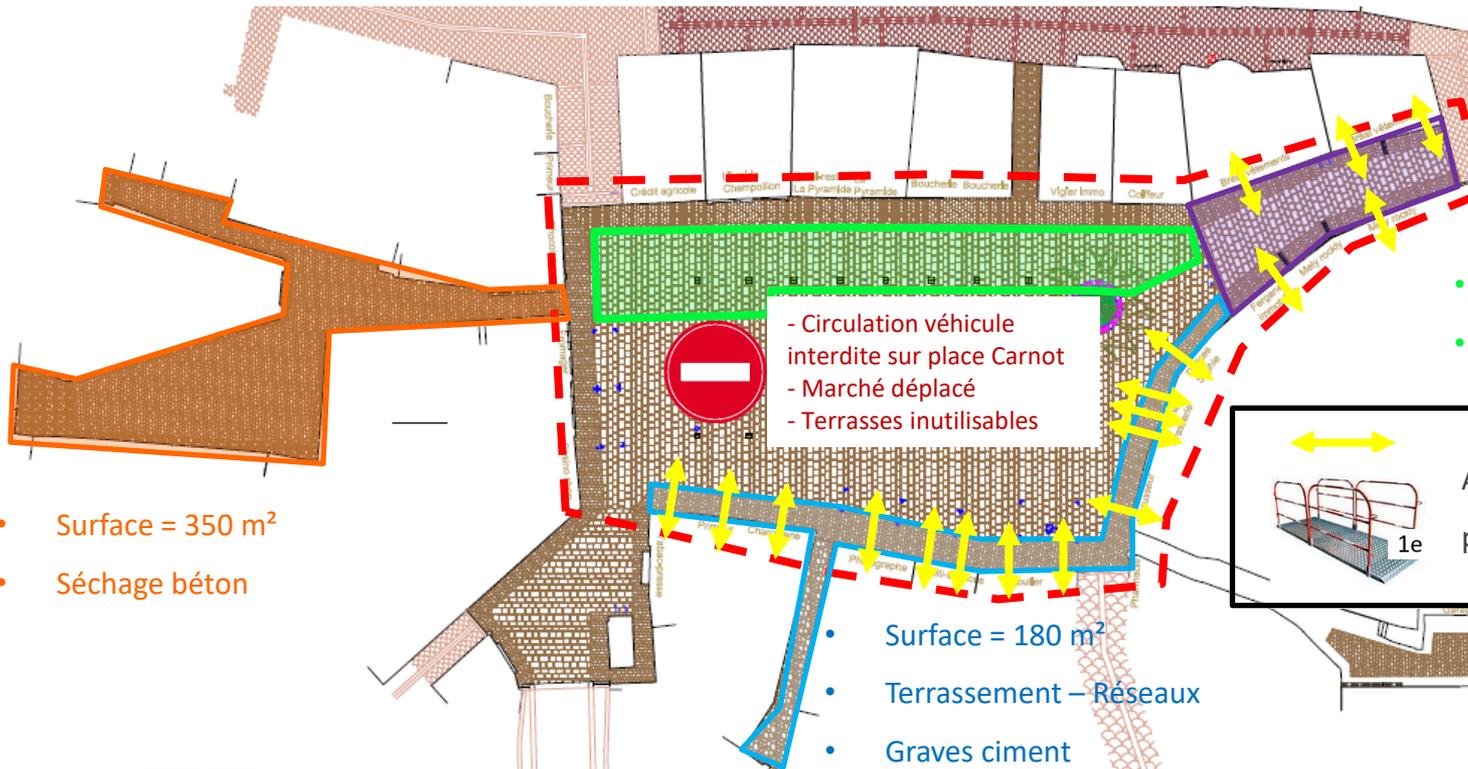


PHASE 1a + Place Lacombe + PHASE 1b + PHASE 1e : 19/10 au 31/10/23

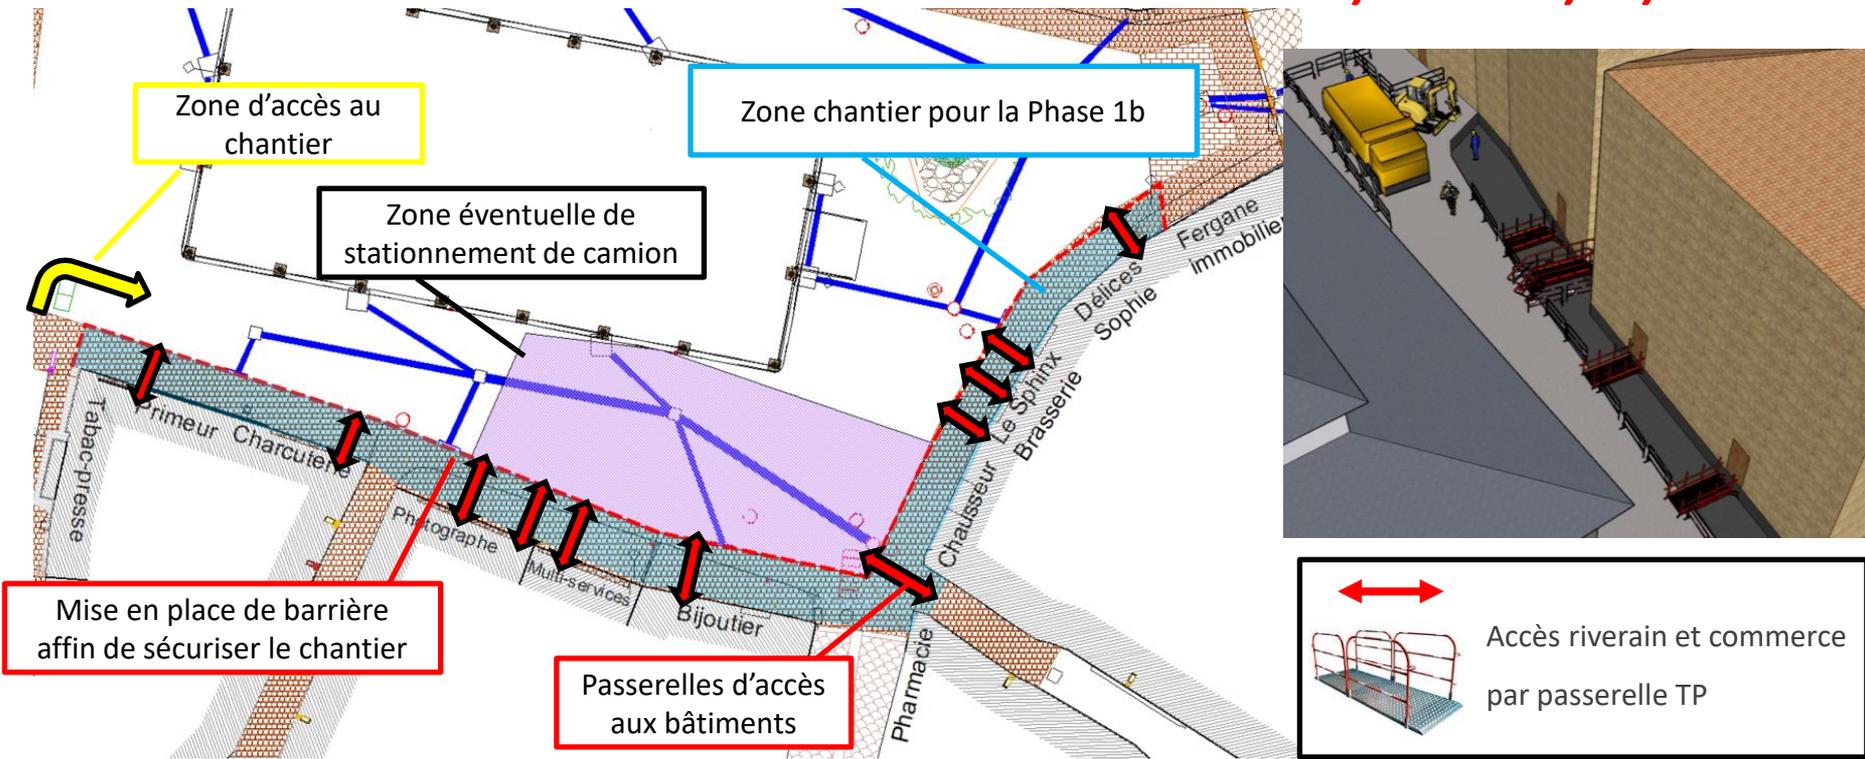


Place Lacombe + PHASE 1b + Phase 1c : 01/11 au 17/11/23

- Surface = 180 m²
- Terrassement – Réseaux
- Plateforme + béton BC5

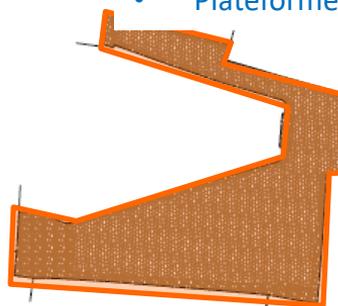


- Surface = 350 m²
- Pose pavés

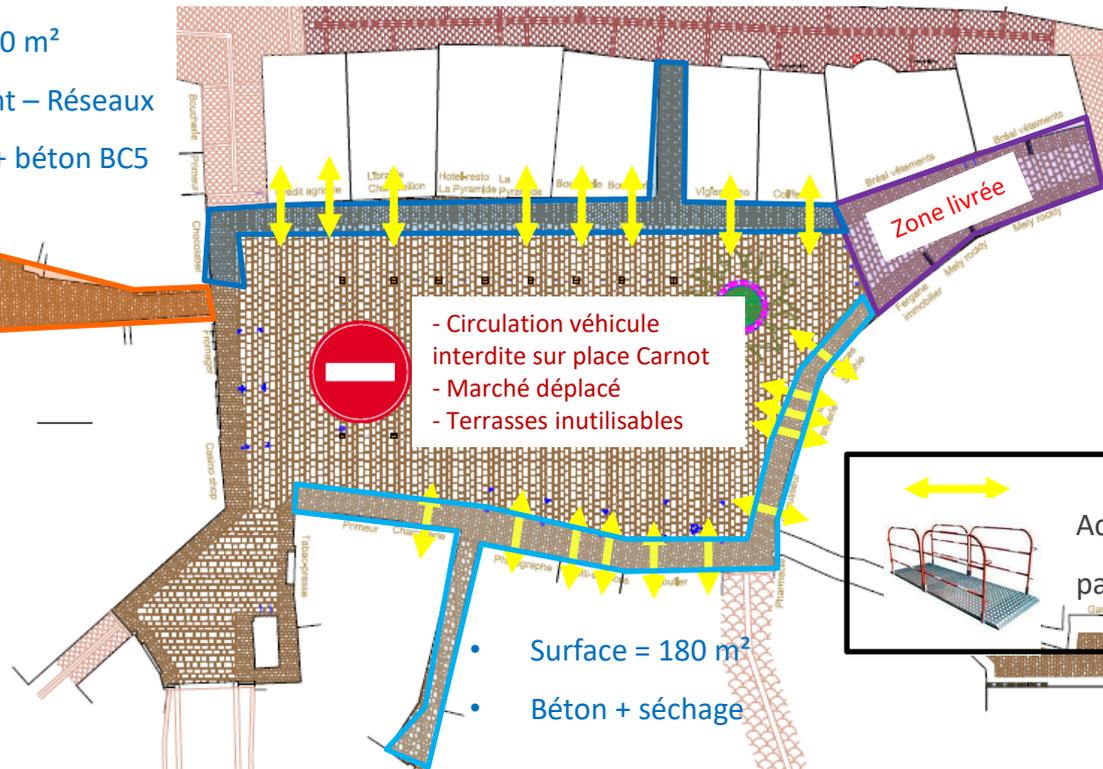

- Surface = 180 m²
- Béton + séchage


PHASE 1b + Phase 1c : 17/11 au 01/12/23

- Surface = 180 m²
- Séchage béton

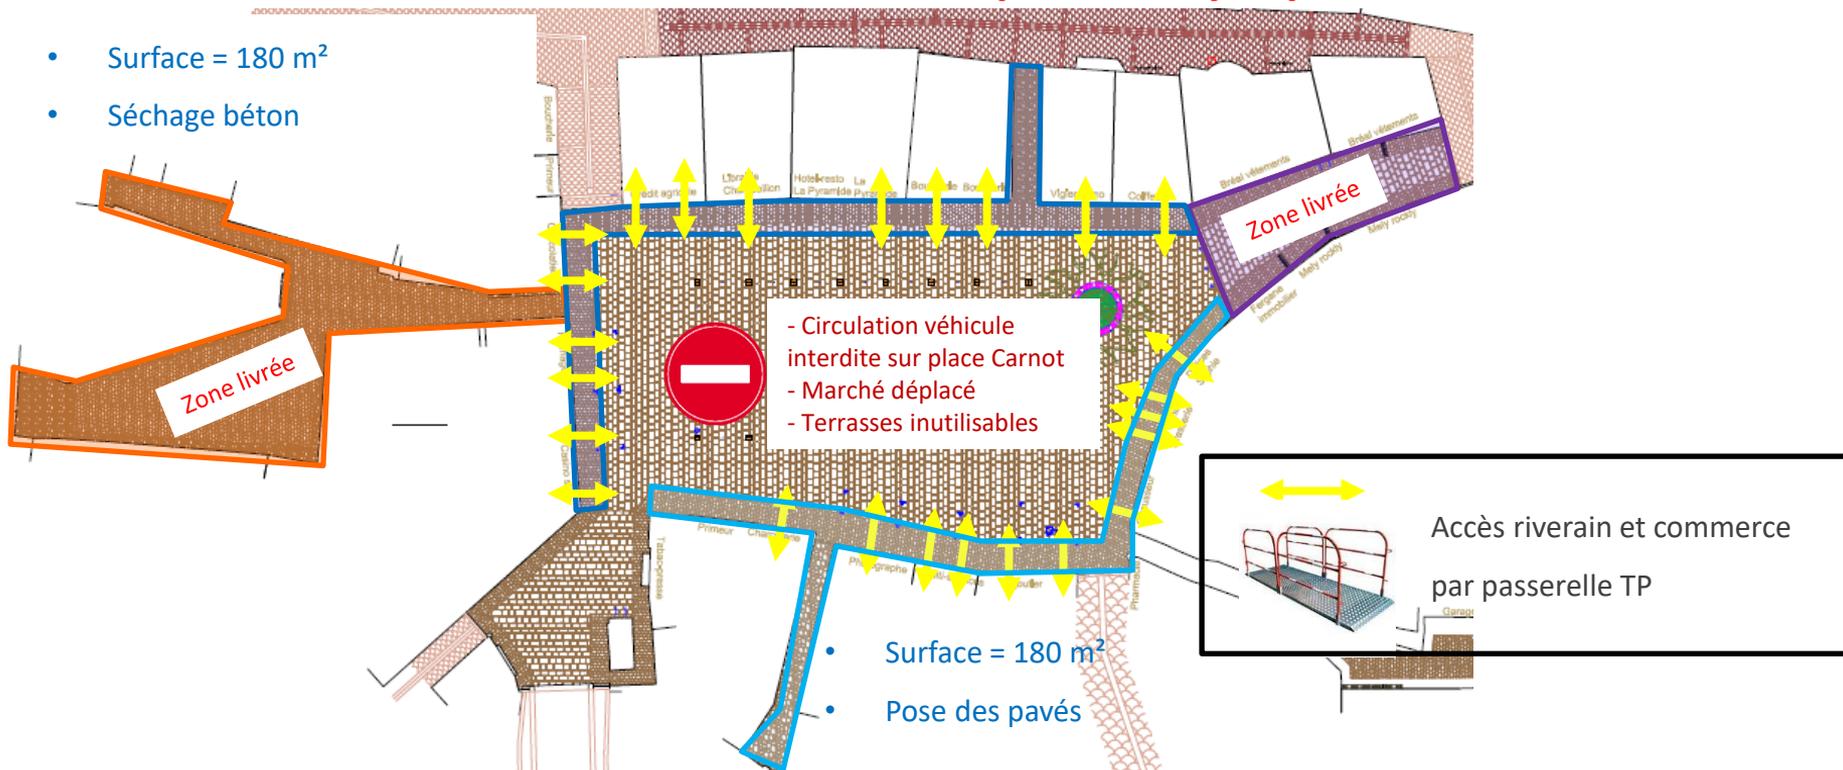

- Surface = 180 m²
- Pose des pavés


PHASE 2a – 02/01 au 09/02/24

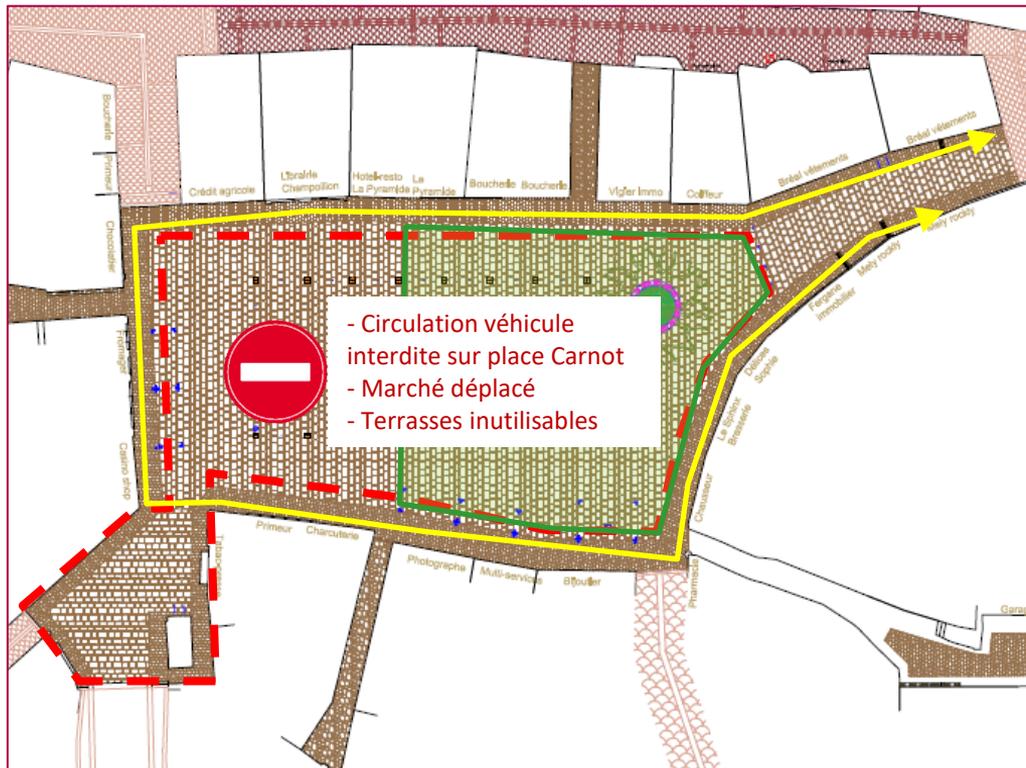

- Surface = 650 m²
- béton BC5
- Séchage



PHASE 2a + Phase 2b – 12/02 au 08/03/24

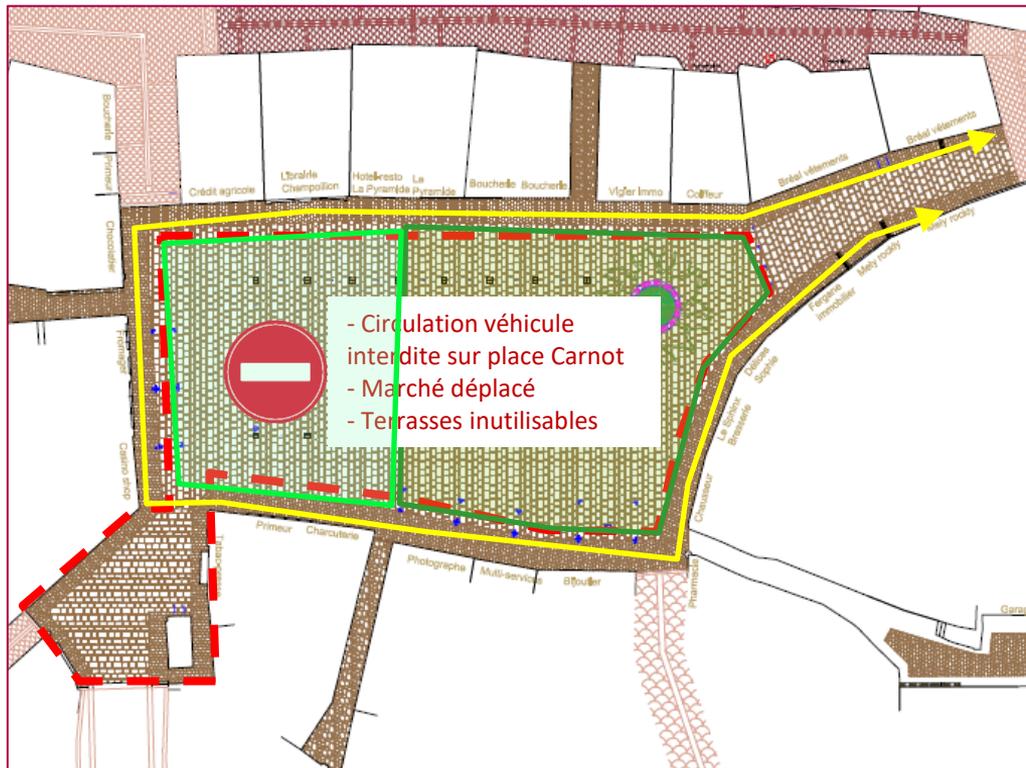


- Surface = 650 m²
- Séchage
- Habillage poteaux halle
- Pose pavés (2 équipes)

- Surface = 500 m²
- Béton




Accès riverain et commerce

PHASE 2b – 15/04 au 10/05/24

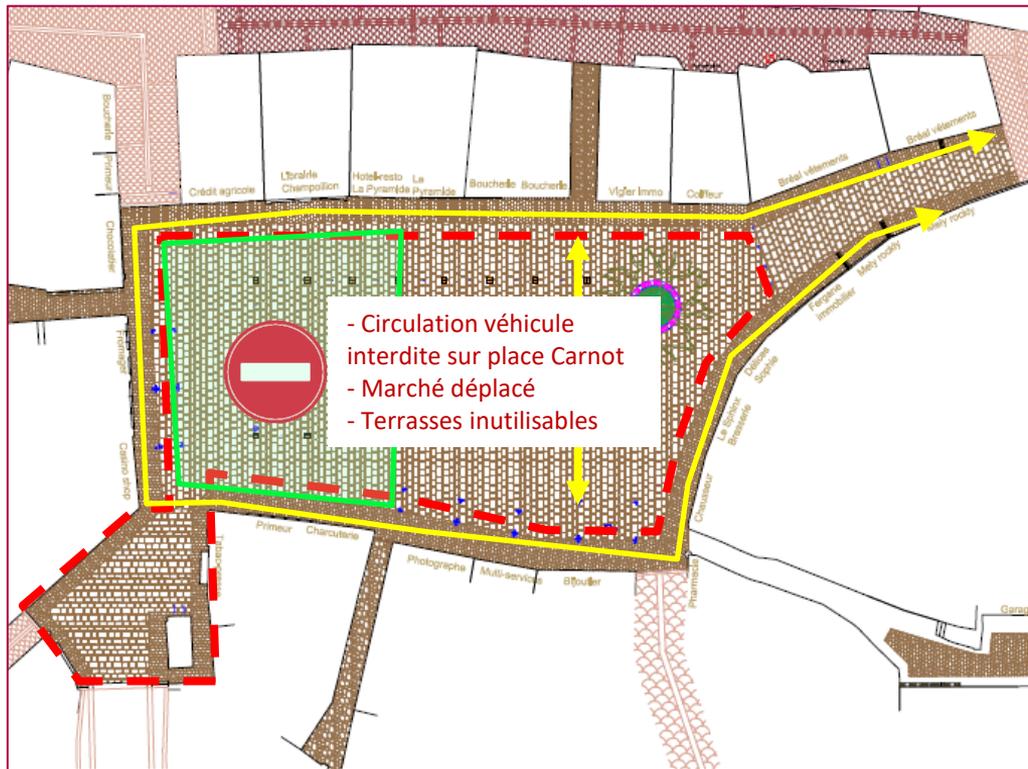

- Surface = 500 m²
- Habillage poteaux halle
- Pose pavés (2 équipes)

PHASE 2c – 13/05 au 28/06/24

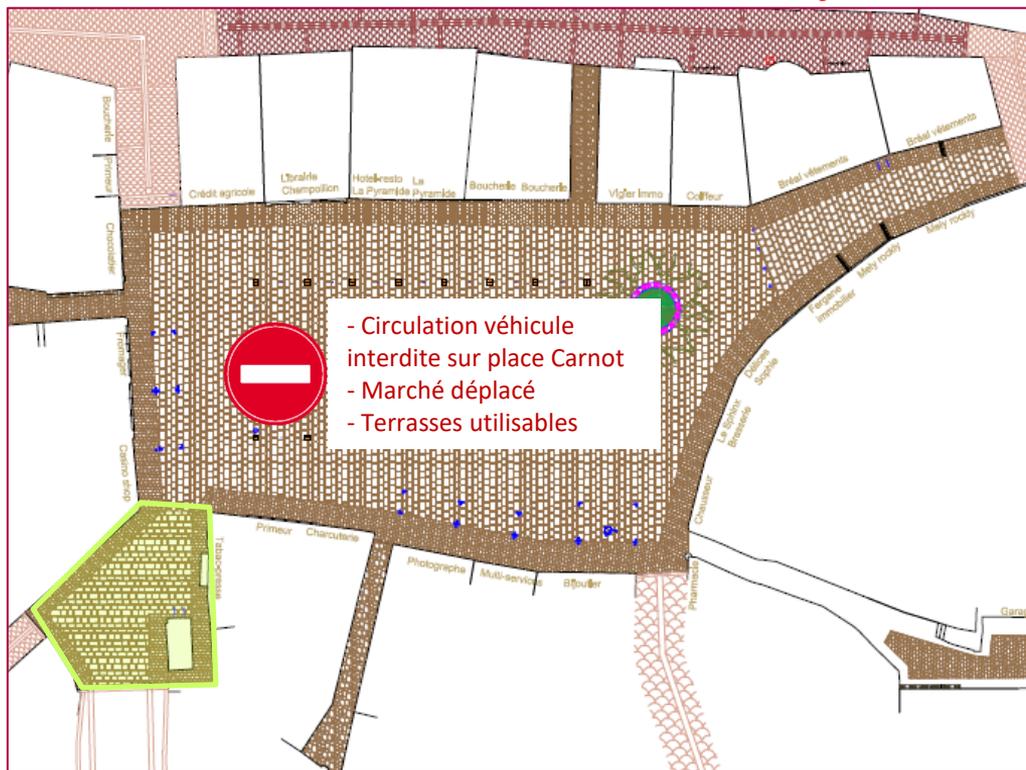

- Surface = 160 m²
- Terrassement – Réseaux
- Plateforme + béton BC5
- Séchage béton
- Pose pavés



Mise en place de cheminement dédiés aux piétons et de passerelles pour accès à chaque bâtiments (une passerelle par entrée)

Les accès chantier sont renseignés selon les phasages de travaux car ils sont amenés à évoluer en fonction des zones chantier.

Un fléchage sera mis en place par les entreprises et sera mis à jour en fonction de l'avancement du chantier.



- Livraisons possibles et maintenues.
- Les entreprises s'organiseront avec chaque commerçant.
- Les modalités seront adaptées en fonction de l'avancement du chantier.
- Présence quotidienne des chefs de chantier.



Gestion des différentes nuisances :

- Réduction de la poussière : - Découpes sous eau
 - Arrosage et humidification des matériaux
- Réduction du bruit : - Utilisation autant que possible de matériel électrique pour remplacer du matériel thermique

