




Réaménagement de la place Carnot et de la place Louis Lacombe

FIGEAC


5 octobre 2023

UN SOL LIBRE, PARCOURABLE EN TOUS SENS

- Araser le socle pour mettre à niveau l'ensemble de la place et libérer les parcours piétons
- Réorganiser le stationnement pour réouvrir les perspectives vers Champollion

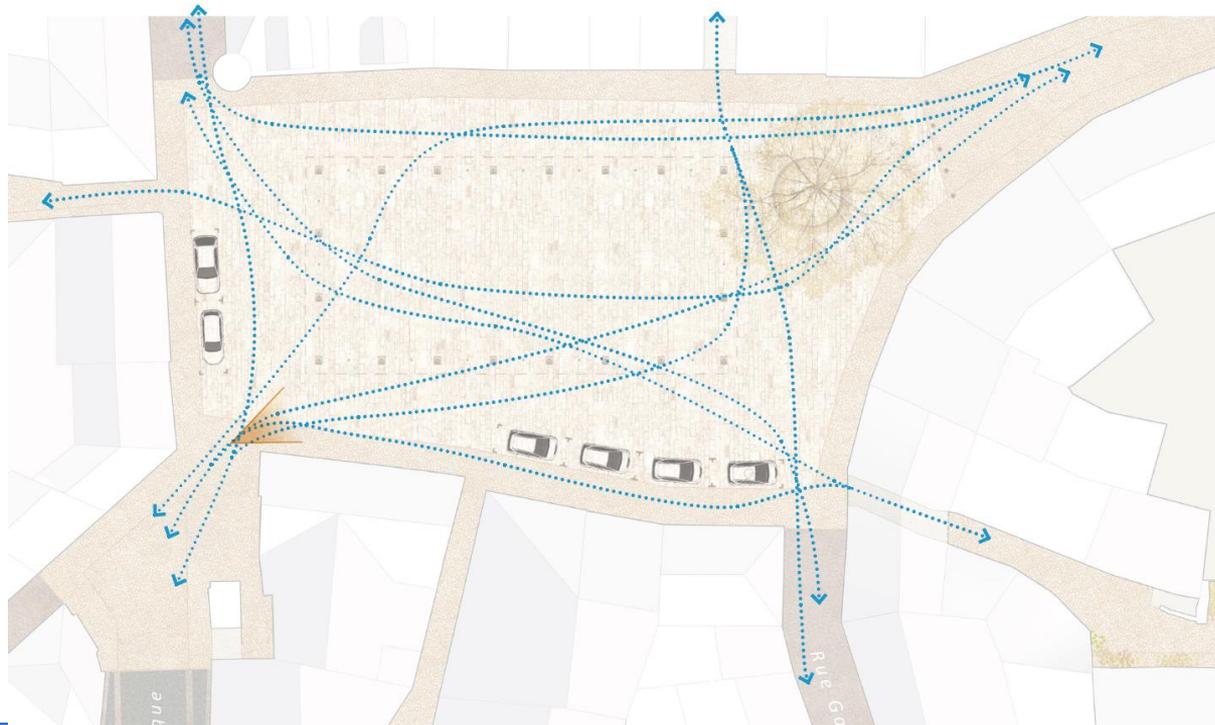

PERSPECTIVE PROJET



PERSPECTIVE PROJET



LOT 1 – VRD - TERRASSEMENTS - RESEAUX

Directeur de Travaux : Laurent LHERITIER 05/65/64/72/39

Conducteur de Travaux : Alain BASTARD 06/70/61/96/72

Chef de Chantier : Pascal TEIL 06/70/61/96/73



Conducteur de Travaux : Jérôme GALLEYRAND 06/70/61/96/72

Chef de Chantier : N. HERMIER 06/70/61/96/73



LOT 2 – PAVAGE - MOBILIER URBAIN - ESPACES VERTS

Directeur de Travaux : Patrice BALDY 06/21/53/68/04

Assistante de Travaux : Solène BOURRIER 06/18/81/65/33

Chef de Chantier : Frédéric COMBELLE 06/75/20/56/85



Conducteur Travaux : Pierre GUILLEMIN 06/43/36/53/21


Chef de Chantier :




LOT 3 – ECLAIRAGE – ELECTRICITE

Directeur de Travaux : Cedric GICQUEL	06/42/17/32/76
Chargé d'affaires : Hugo LAPORTE	06/23/31/62/75
Conducteur de Travaux : Hugo VIDAL	06/30/75/22/91
Chef de Chantier : Romain BONNET	06/70/57/52/00



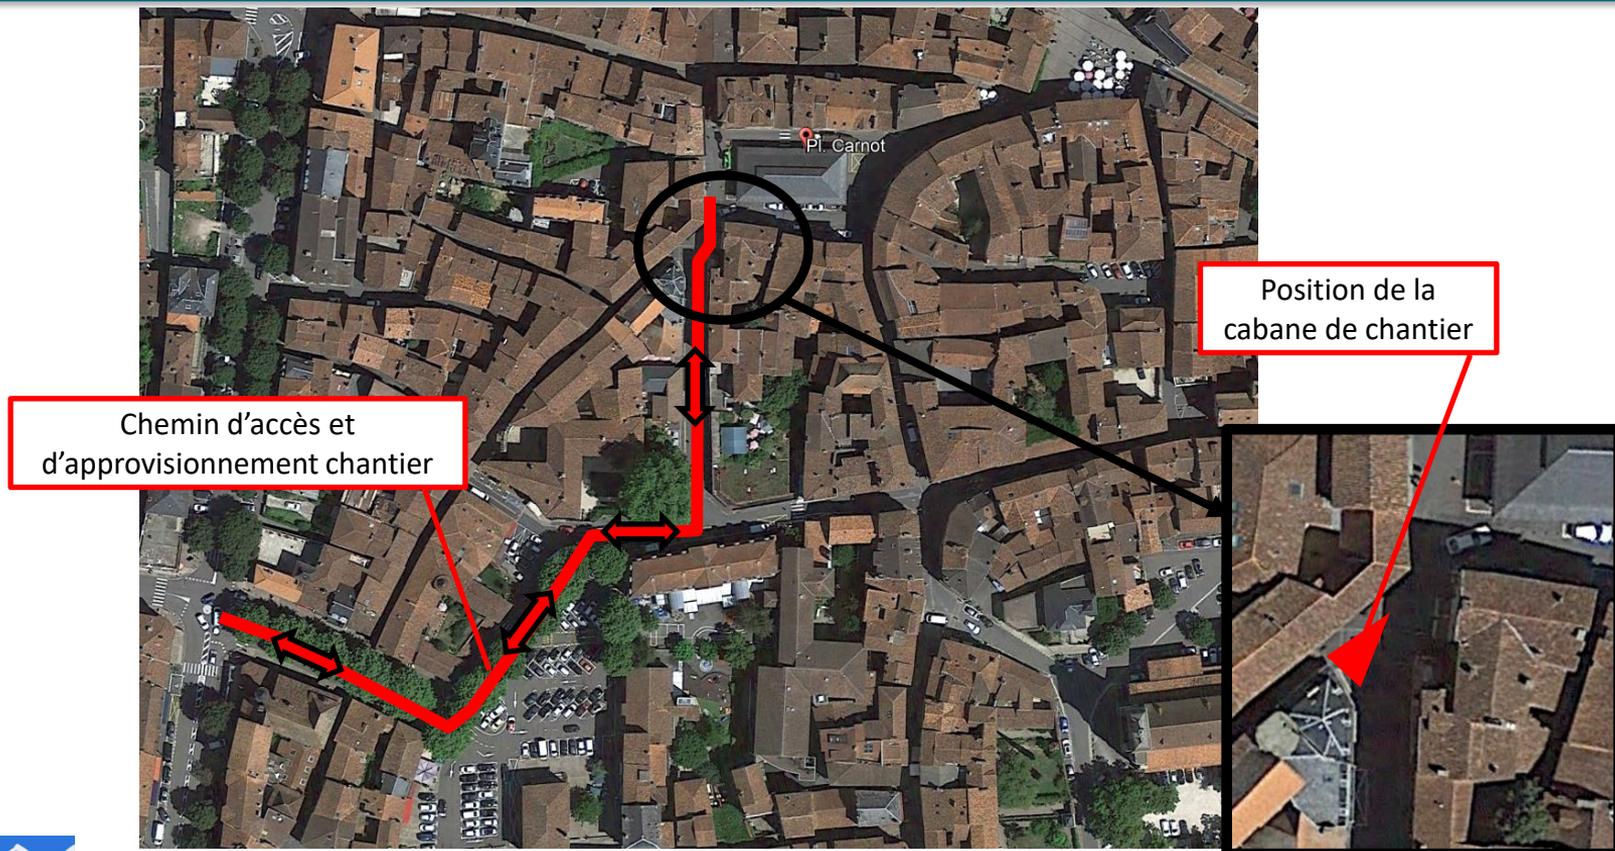

Plan de situation des phases

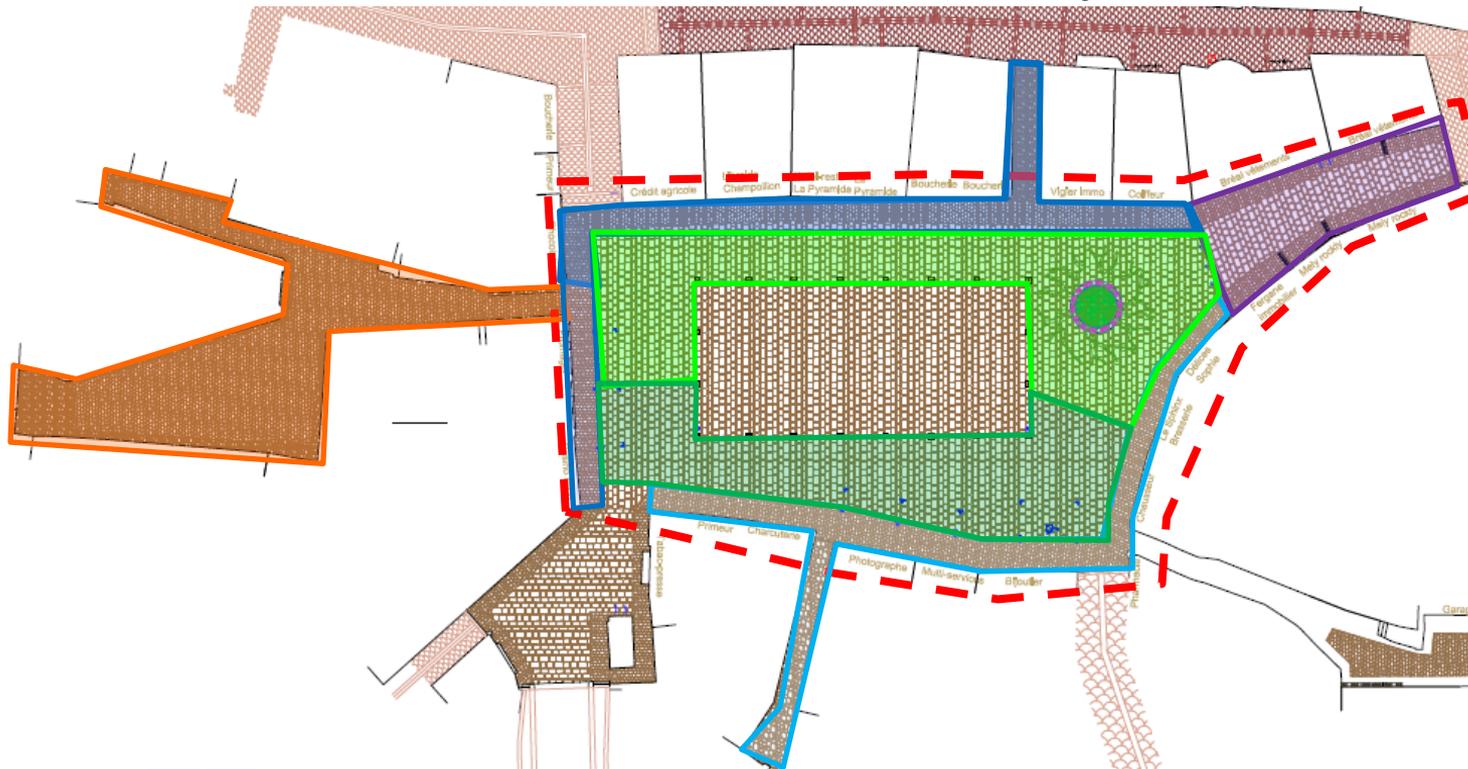


- Phase 1a
- Phase 1b
- Phase 1c
- Phase 1d
- Phase 1e
- Place Lacombe




PHASE 1a + Place Lacombe + PHASE 1e + Phase 1c + PHASE 1b : 09/10/23 au 31/10/23

1C : Surface = 180 m²
Terrassement + Grave Ciment +
réseau + béton

1 E : Surface = 416 m² Terrassement +
Grave Ciment + réseau

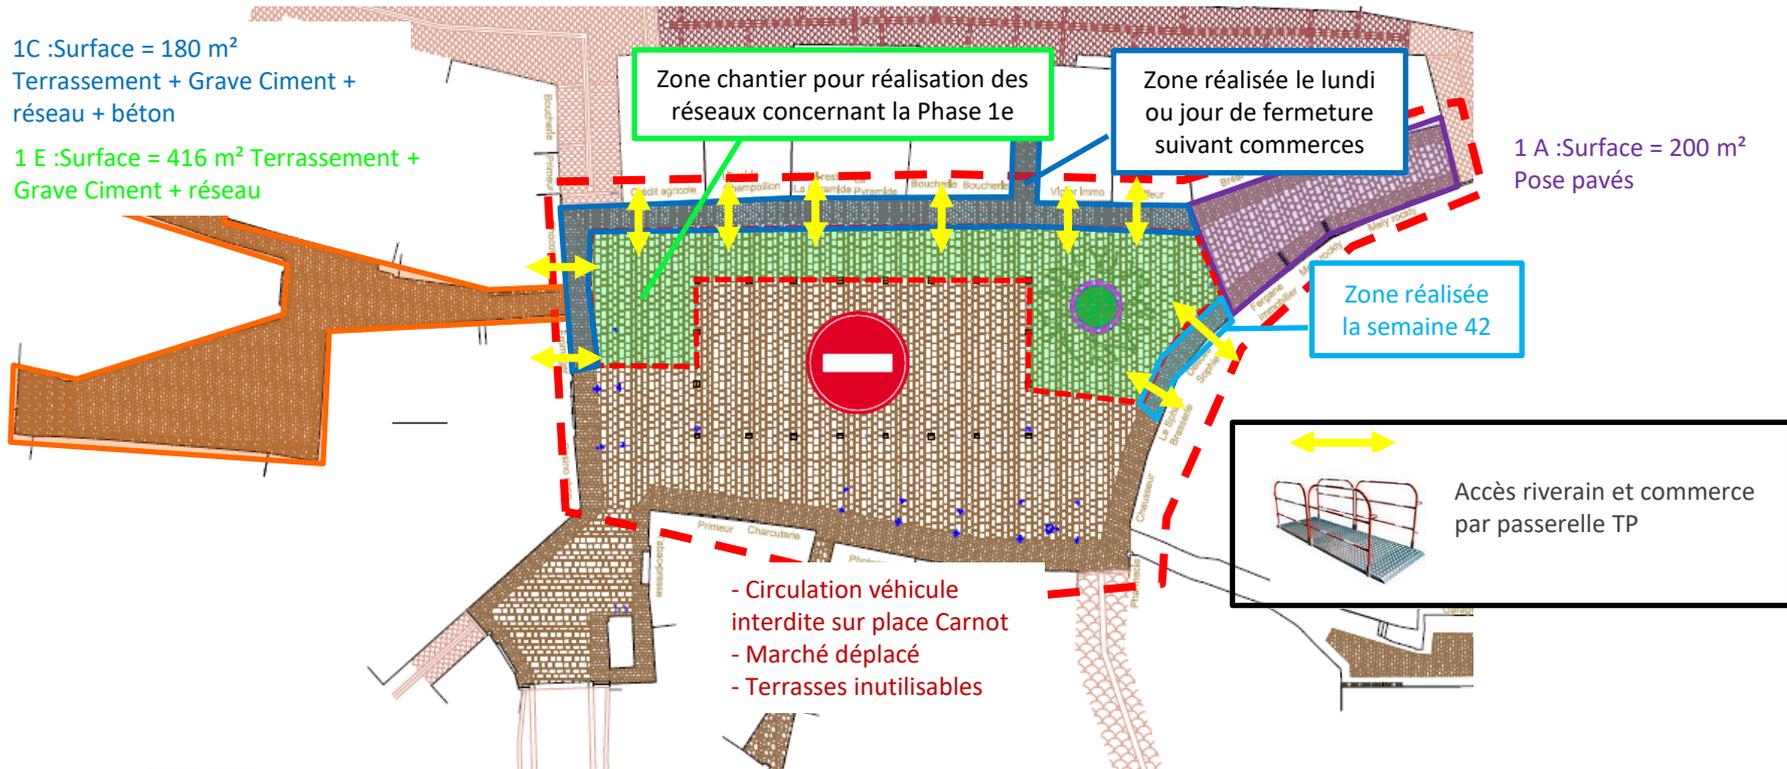


PHASE 1a + Place Lacombe + PHASE 1e + Phase 1c + PHASE 1b : 09/10/23 au 31/10/23

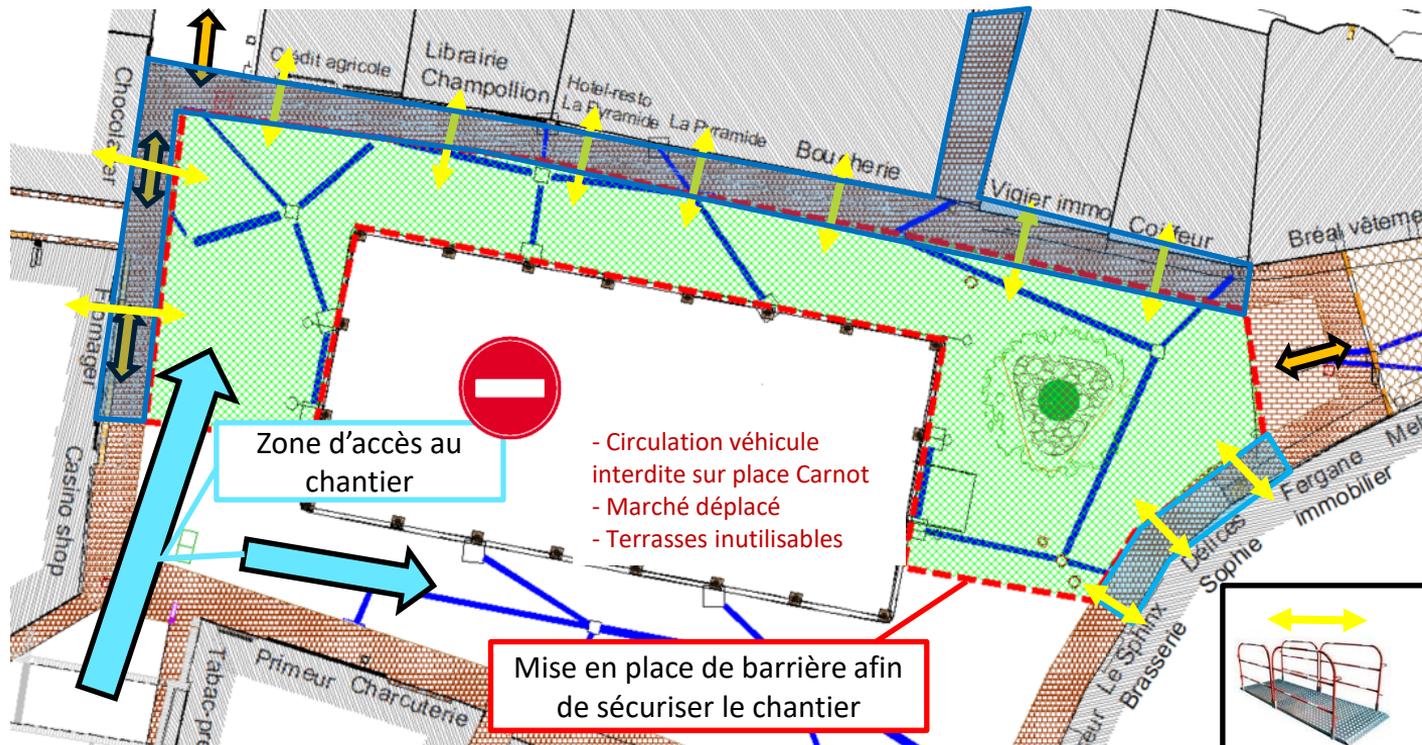


1 C : Surface = 180 m²
Terrassement – Réseaux
Plateforme + béton BC5




1 E : Surface = 416 m²
Terrassement
Pose des réseaux
Grave Ciment + Béton
Temps de séchage




PHASE 1a + PHASE 1e + Phase 1d + Phase 1c + PHASE 1b : 31/10/23 au 01/12/23

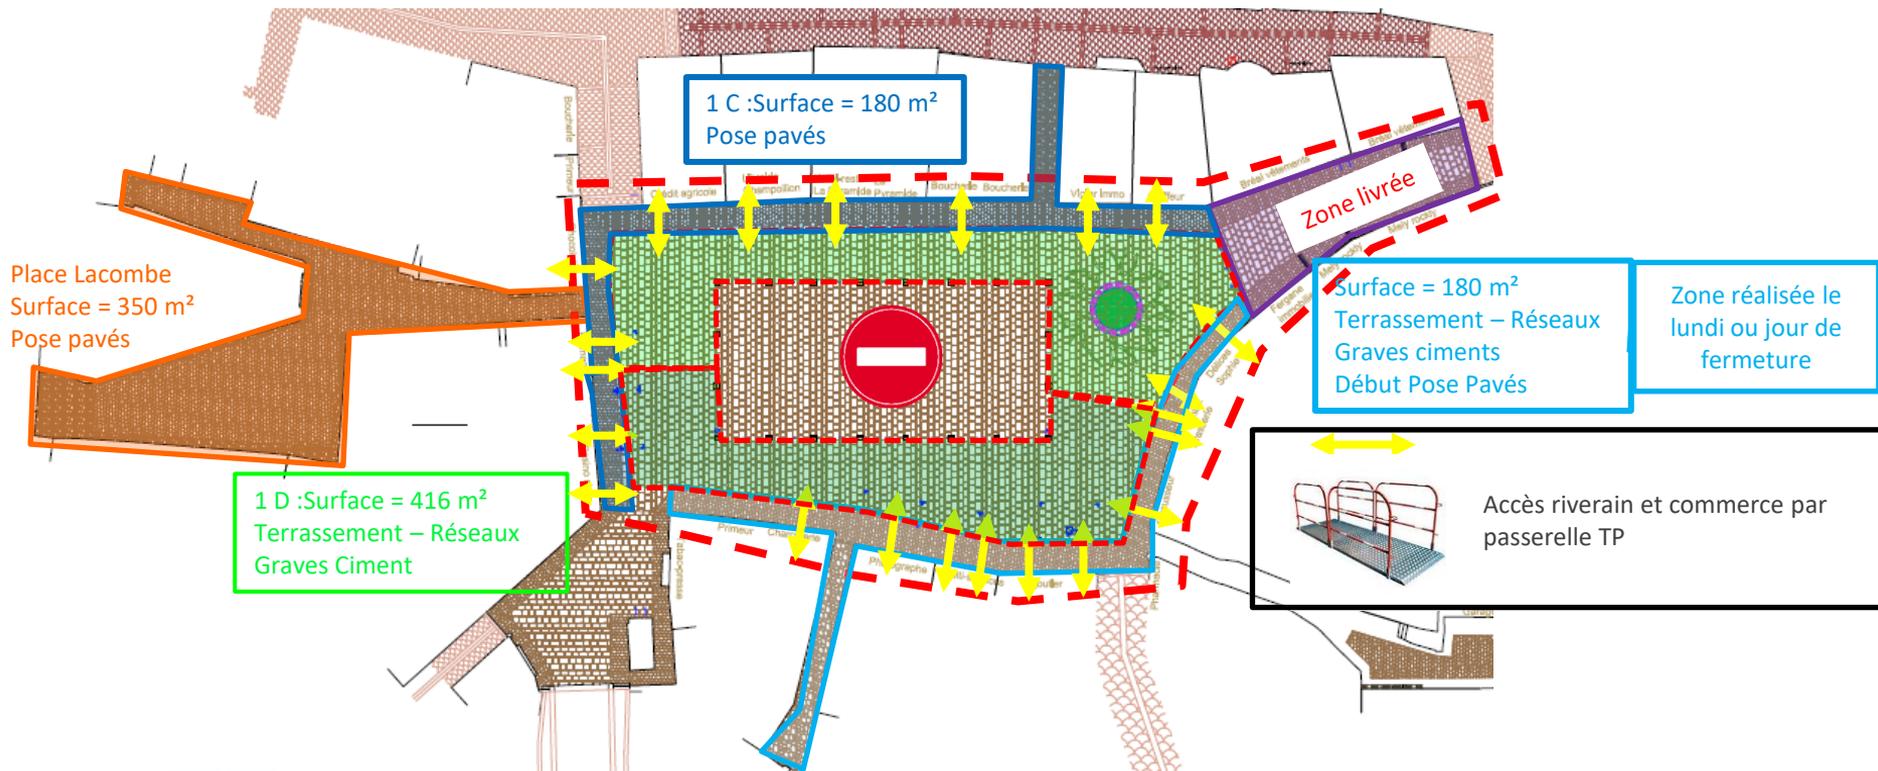

PHASE 1a + PHASE 1e + Phase 1d + Phase 1c + PHASE 1b : 30/10/23 au 01/12/23

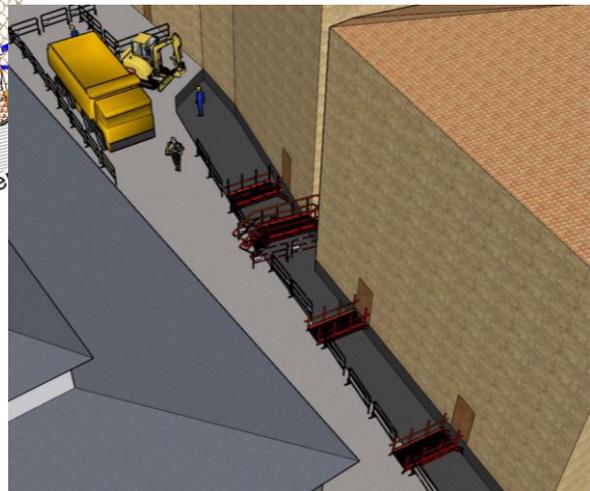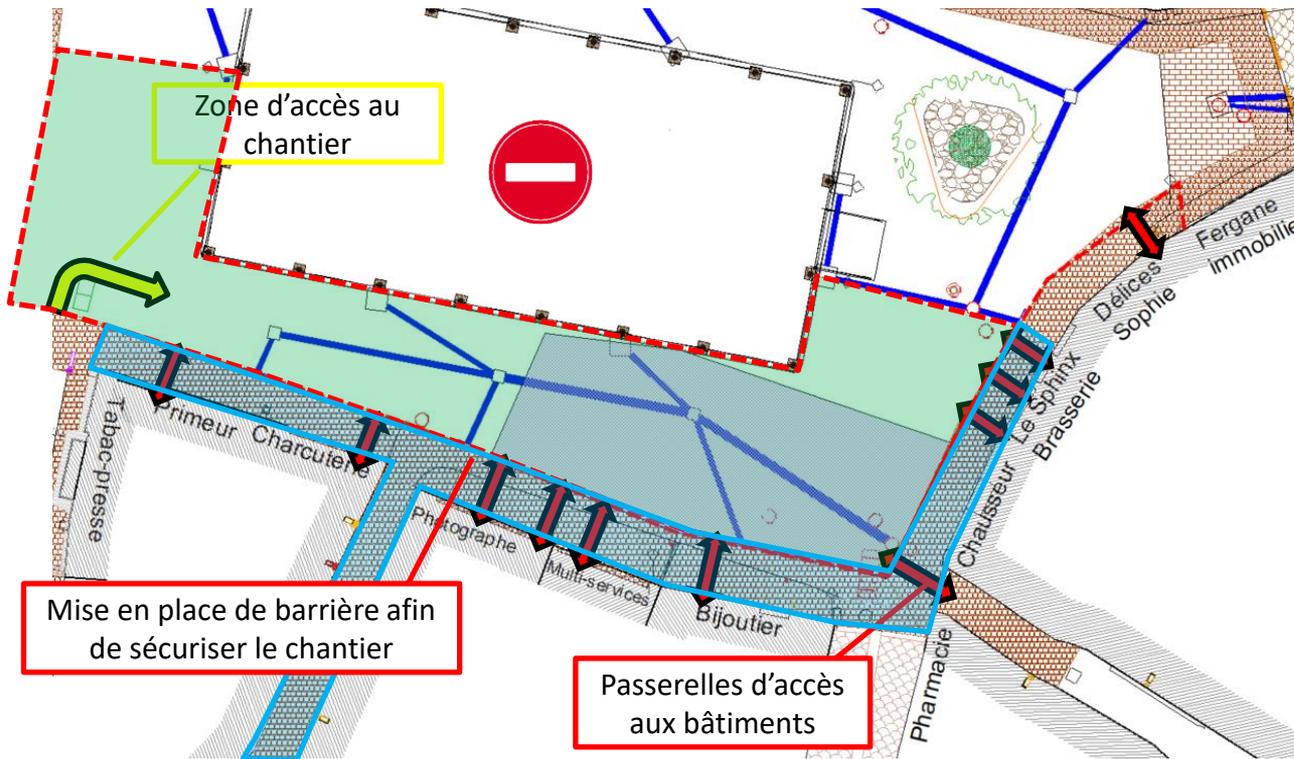


PHASE 1 – 17 semaines au total

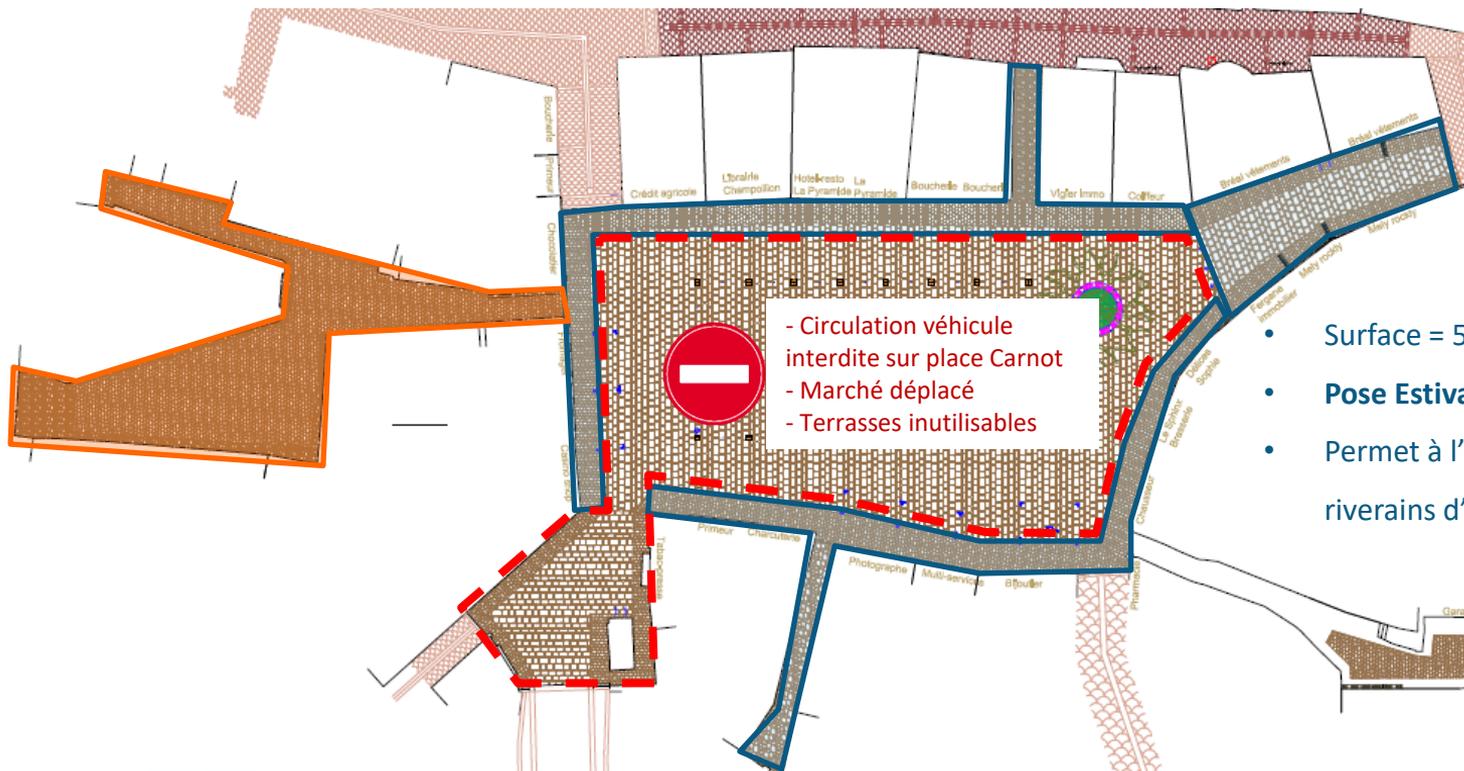

- Surface = 550 m² + Place Lacombe
- Pose Estivale de fin-juin à mi-Septembre
- Permet à l'ensemble des commerces et riverains d'accéder à leurs locaux


PHASE 2a – 02/01 au 09/02/24

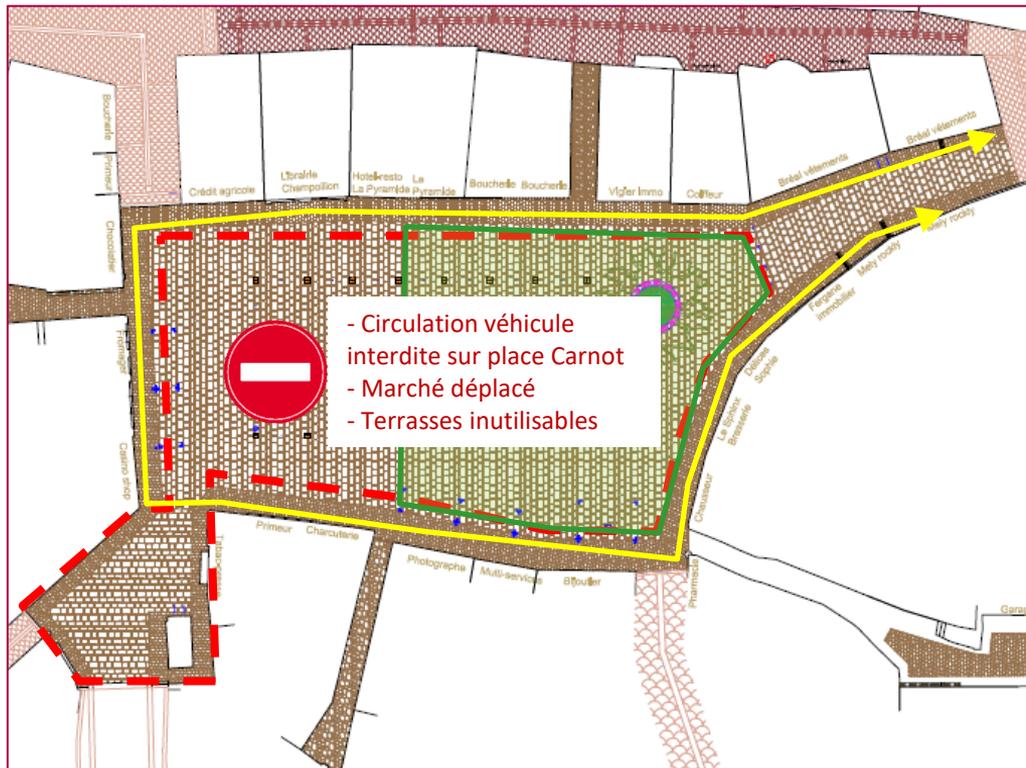

- Surface = 650 m²
- béton BC5
- Séchage



PHASE 2a + Phase 2b – 12/02 au 08/03/24

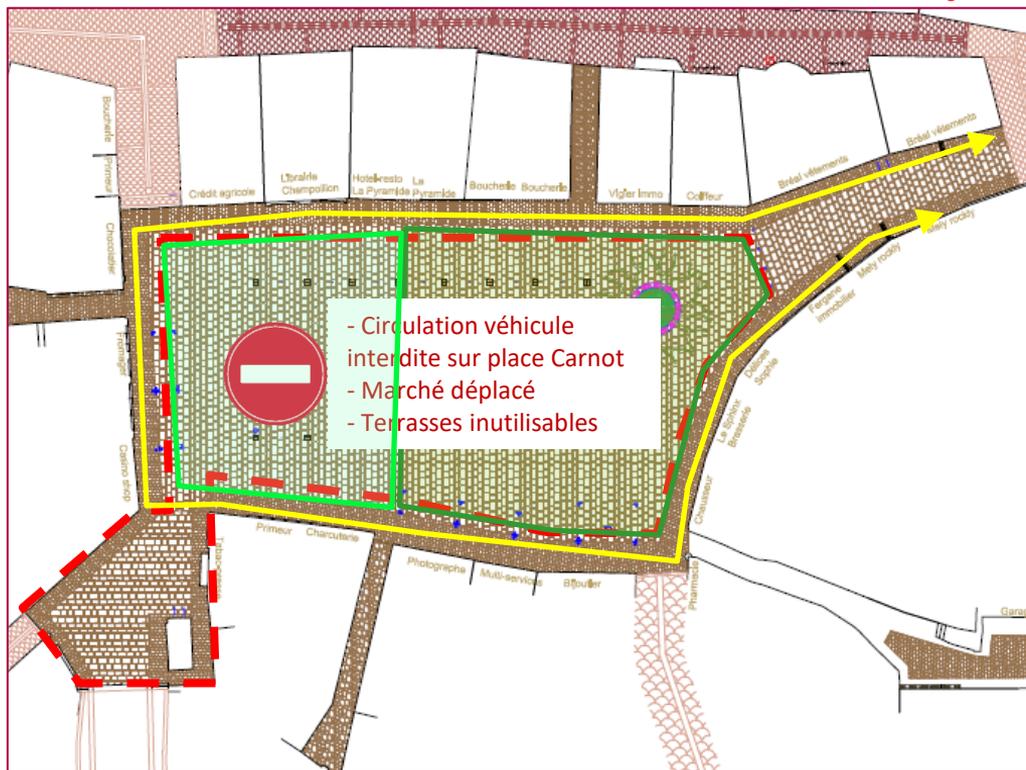


- Surface = 650 m²
- Séchage
- Habillage poteaux halle
- Pose pavés (2 équipes)

- Surface = 500 m²
- Béton




Accès riverain et commerce

PHASE 2b – 15/04 au 10/05/24

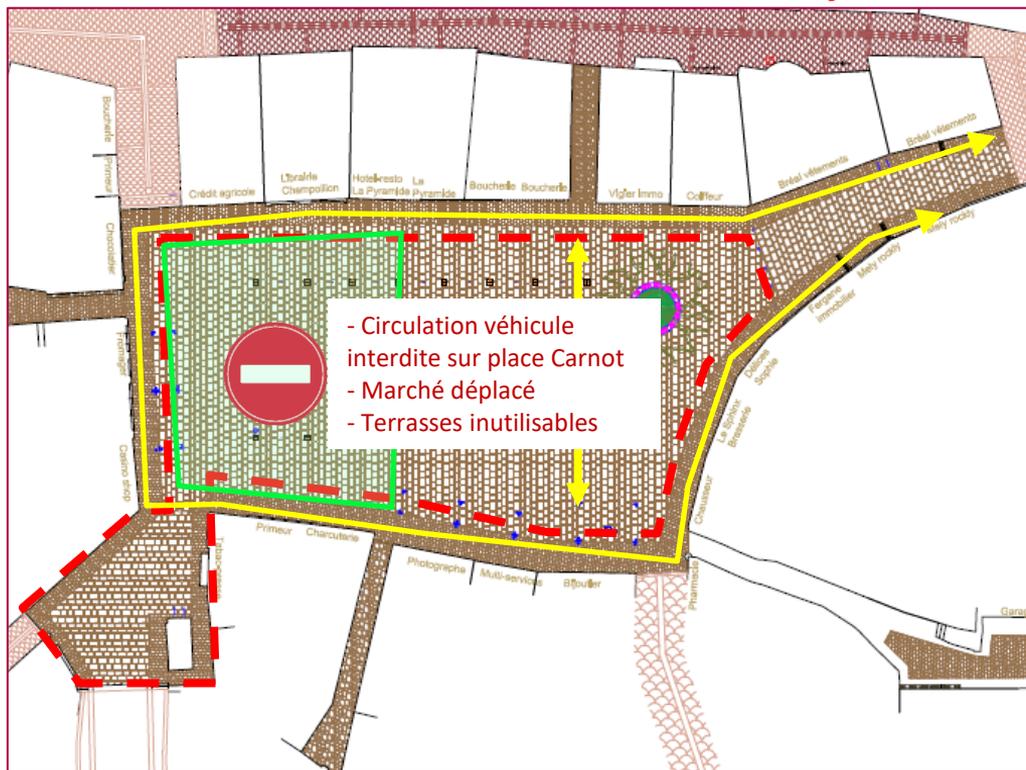

- Surface = 500 m²
- Habillage poteaux halle
- Pose pavés (2 équipes)

PHASE 2c – 13/05 au 28/06/24

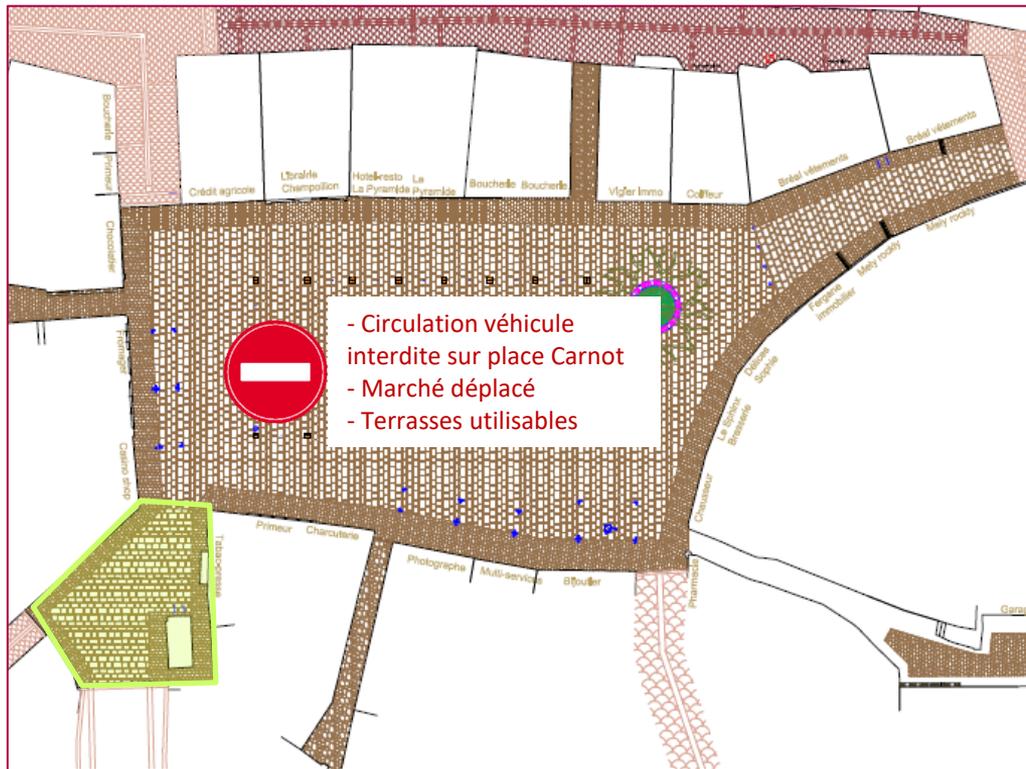

- Surface = 160 m²
- Terrassement – Réseaux
- Plateforme + béton BC5
- Séchage béton
- Pose pavés



Mise en place de cheminement dédiés aux piétons et de passerelles pour accès à chaque bâtiments (une passerelle par entrée)

Les accès chantier sont renseignés selon les phasages de travaux car ils sont amenés à évoluer en fonction des zones chantier.

Un fléchage sera mis en place par les entreprises et sera mis à jour en fonction de l'avancement du chantier.



- Livraisons possibles et maintenues.
- Les entreprises s'organiseront avec chaque commerçant.
- Les modalités seront adaptées en fonction de l'avancement du chantier.
- Présence quotidienne des chefs de chantier.



Gestion des différentes nuisances :

- Réduction de la poussière : - Découpes sous eau
 - Arrosage et humidification des matériaux
- Réduction du bruit : - Utilisation autant que possible de matériel électrique pour remplacer du matériel thermique

